開発のご提案

BRUMBY
AI 物件販売戦略

システム開発と PoC （事前検証）のご提案



株式会社クラウドネイチャー

2026 年 9 月

前回いただいたご要望と論点

本資料では、いただいたご要望と 3 つの論点にお答えします

目指すこと

新事業としてのサブスク型サービス

不動産会社・住宅会社に月額で提供

物件ごとの販売戦略を自動で提案

狙う層・訴求・媒体・予算配分まで

BRUMBY の制作・広告につなげる

分析から実行までを一貫して受注

3 つの論点

Q1 競合物件のデータを どう集めるか — P.7

Q2 費用を抑えて 小さく始められるか — P.13/16

Q3 10 月に見せられる 叩き台を用意できるか — P.12

不動産会社の販売の現状

前回のお打ち合わせで伺った内容を整理しました

膨らむポータル課金

掲載料に加えて、上位表示のための追加課金が年々重くなっている

待ちの集客

問い合わせ待ちと、1回40〜50万円のイベント出展が中心

担当者の経験頼み

媒体の選び方や予算の配分を、社内や取引先に根拠をもって説明しにくい

「誰に、どこで、いくら使えば売れるか」を根拠つきで示せれば、ポータル以外の打ち手になる

物件ごとに示す、４つの答え

エリアのデータを根拠に、販売戦略を 1 枚のレポートにまとめます

誰に **狙う層**

例： 30 〜 40 代の子育て世帯
（賃貸からの住み替え）



何を **訴求ポイント**

例：小学校まで徒歩 8 分の
子育て環境

どこで **媒体**

例： Instagram 広告と
ポスティング

いくらで **予算配分**

例：総予算 20 万円のうち
Instagram に 8 万円

根拠：国勢調査・不動産情報ライブラリなどの公開データ ＋ 物件の情報

画面イメージ：販売戦略レポート

狙う層から予算配分、進め方まで、販売会議でそのまま使える形にまとめます（画面はイメージ、数値はサンプル）



1 狙う層に優先順位
世帯データから判断

2 訴求に根拠を添える
出典まで確認できる

3 予算配分は自動計算
ノウハウをルール化

4 そのまま相談へ
制作・広告を依頼

画面イメージ：エリア分析

町丁目ごとの世帯構成と周辺の取引価格を、地図とデータで把握します（画面はイメージ、数値はサンプル）



1 世帯構成を地図で表示

子育て世帯が多い地区が一目でわかる

2 半径ごとに人口・世帯を集計

市の平均と比べてエリアの特徴をつかむ

3 取引価格と競合物件を比較

価格で勝負するか、条件で勝負するかを判断

権利面に配慮したデータの集め方

公開データは自動で。競合物件は「3分入力」と「BRUMBYの代行」の2つの方法で集めます（競合は最大3件）

自動取得

公開データ　担当：システム

取引・成約価格、人口・世帯、用途地域・学区

3分で入力

競合物件　担当：不動産会社

気になる競合を最大3件、価格・間取り・特徴だけ

代行入力

BRUMBYの運用プラン　担当： BRUMBY

連絡を受けてBRUMBYが入力と更新を代行

戦略レポート

根拠と出典つき

ポータルサイトからの機械的な自動収集は行いません。利用規約と権利面のリスクを避けるためです


ChatGPT に相談する場合との違い

数字はシステムが計算し、 AI は読み解きと説明に専念します

	ChatGPT に相談する場合	BRUMBY AI 物件販売戦略
地域のデータ	一般的な知識で回答	町丁目単位の公開データを使用
数字の根拠	もっともらしい数字が出ることも	システムが計算した数字だけ
出典	確認が難しい	出典とデータの時点を表示
予算配分	聞くたびに変わりやすい	ルールに基づき毎回同じ基準
物件の管理	会話ごとに流れてしまう	物件ごとに保存・比較・再分析

収益が積み上がる事業モデル

利用料・運用代行・制作広告の 3 つの収益が、データの蓄積とともに強くなります

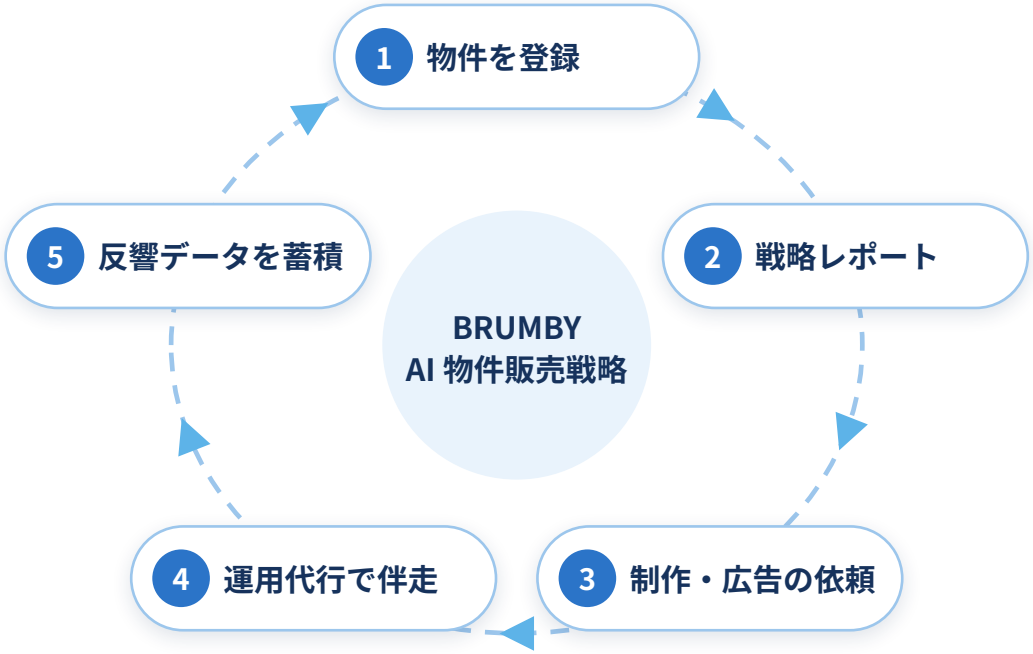

BRUMBY の収益源

利用料（月額）
不動産会社からのサブスク収入

運用代行（月額）
競合入力と販売状況の見守り

制作・広告（案件ごと）
LP ・動画・広告運用・チラシ

将来：外部データ連携で独自性を強化

開発ロードマップ

まず小さく検証し、取引先での試験導入を経て、販売と拡大へ進みます

2026 年 10 月〜 11 月上旬	PoC 後に期間を確定	試験導入の結果をもとに	中長期
Step 1 PoC	**Step 2 本番開発**	**Step 3 販売開始**	**Step 4 展開**
小さく検証する ● 公開データの実測 ● 画面と AI の試作 ● 10 月下旬に叩き台	**取引先で試す** ● ログイン・権限 ● PDF ・相談の導線 ● 2 〜 3 社で試験導入	**販売を始める** ● 料金プラン・課金 ● 販売モニター ● 運用代行の仕組み	**広げる** ● 対象エリアの拡大 ● 外部データ連携 ● 取引先の拡大

費用の目安は P.16 でご案内します。本番開発の範囲は PoC の結果をもとに確定します

PoC で確かめる 2 つのこと

作り込む前に、事業の成否を分ける 2 点を約 4 〜 5 週で検証します

確認 1

公開データは足りるか

確かめ方

新潟市の中心部・郊外・周辺の市町村で、
実物件をもとにデータの量と精度を実測

わかること

対象にできるエリアと物件の種類

確認 2

実務で使える戦略が出るか

確かめ方

実物件で戦略を作成し、
BRUMBY 様と取引先 2 〜 3 社に評価いただく

わかること


本番開発で作り込むべき機能と優先順位

PoC の成果物

- データ測定の結果
- 操作できる叩き台
- 戦略の評価結果
- 本番開発の要件と見積

PoC のスケジュール

10 月 5 日に開始した場合の例です（開始日はご依頼の日に合わせて調整します）

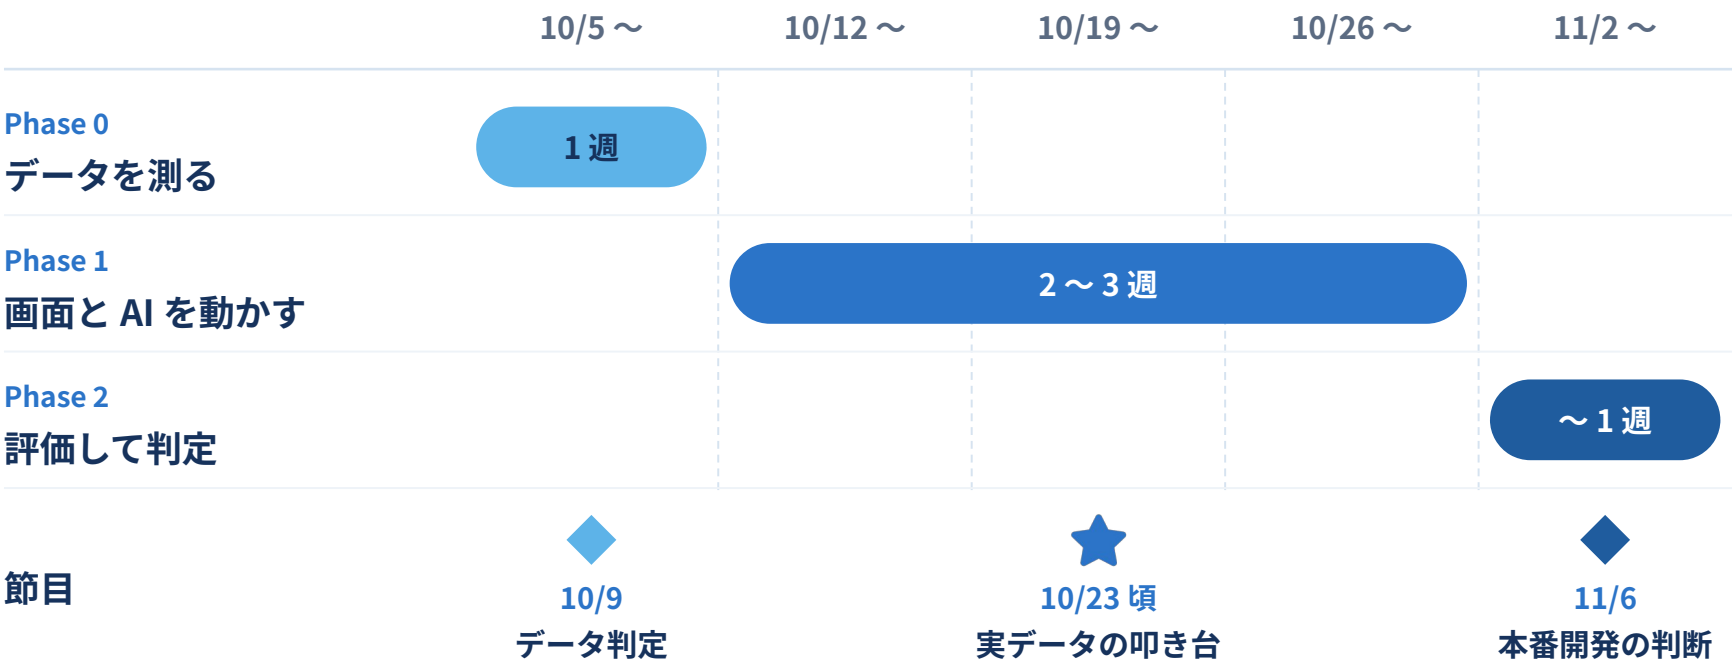

PoC 後の判断と費用の考え方

結果をもとに一緒に判断し、本番開発に進む場合は PoC の費用を開発費用に含めます

PoC 後の判断

Go

データと戦略の質を確認できた

本番開発の要件と見積を確定

条件付き Go

一部の地域や物件種別に課題

対象を絞って本番開発へ

再設計

重要なデータが得られない

データ源や機能を見直して再検証

費用の考え方

PoC で終える場合

PoC 費用

本番開発に進む場合

PoC 費用を含む | **本番開発の費用**

PoC の分を上乗せしません

金額は P.16 でご案内します

プロジェクトの体制

事業の知見は BRUMBY 様、形にする部分はクラウドネイチャーが担います

BRUMBY 様

- 事業の方針と販売
- 評価の基準と予算配分のノウハウ
- 制作・広告の実行

クラウドネイチャー

- 要件定義と設計
- 開発と AI の実装
- 公開後の保守・改善

AI を前提にした開発

自社プロダクトで培った
実装力で、速く形にします

新潟拠点で対面の伴走

近い距離で、判断と改善を
速く回します

確かめてから作る

PoC で確かめてから本番へ。
無駄な開発を避けられます

費用対効果

1 物件の戦略づくりが 4 時間→ 30 分に。月 10 件で浮く約 35 時間の使い道で、売上への効き方が変わります

浮いた時間の使い道

営業に使う

すぐ効く

新しい提案を月 10 件増やす

月 40 万円の売上増

受注率 2 割・ 1 件 20 万円で試算

育成・チームに使う

半年〜 1 年後

若手も根拠のある提案ができる

担当できる物件が増える

特定の人に頼らない体制になる

やらなかった場合に失うもの

売上の機会 — **年間 約 480 万円**

手作業では提案件数に上限がある

先行の立場 — **取引先とデータ**

ポータル側も似たサービスを開始

交渉の材料 — **動く物がない**

外部データ連携の話が進みにくい

概算お見積り（ AI をフル活用した場合）

同じように AI を使っても、体制と値付けの仕組みで金額は大きく変わります

① 大手開発会社

600 ～ 1,000 万円

期間 5 ～ 6 か月
税別

- ✓ 体制と品質保証が手厚い
- − 書類・社内レビュー・多層の体制が残る
- − 人月請求で、 AI で浮いた分が価格に出にくい

② 受託開発会社

350 ～ 550 万円

期間 4 ～ 5 か月
税別

- ✓ 契約と保守の体制が安定
- − 人月請求で、従来に近い金額になりやすい
- − データと AI の良し悪しを判断できる人が必要

③ クラウドネイチャー

250 万円

期間 3 ～ 4 か月
PoC 30 万円を含む・税別

- ✓ **AI 前提の作り方で工数そのものを圧縮**
- ✓ **データ整備と AI 出力の評価を自社で判断**
- ✓ **PoC で確かめてから本番へ進める**

250 万円でできる理由：人月ではなく成果で値付けし、 AI で浮いた工数をそのまま価格に反映しています

※ ①② は一般的な人月単価と、 AI を活用した場合の工数から算出した目安です（税別）

250 万円の回収の見通し

初期費用はかかりますが、約 11 か月で回収し、 2 年目には大きな利益を生む計算です



回収まで
11 か月目
標準の前提

営業効果を含めると
8 か月目
月 40 万円の売上増を加算

2 年で累計
約 +1,200 万円
初期費用を差し引いた後

前提

- 1 社あたりの粗利 月 5 万円（利用料 月 3 万円＋運用代行・制作広告の粗利 月 2 万円）
- 初月 2 社から毎月 1 社ずつ導入が増える／運用費 月 8 万円（保守・サーバー・ AI 利用料）
- 数字は仮置きです。御社の想定の月額や導入社数で計算し直します

次のステップ

本日ご確認いただければ、 10 月 5 日から PoC を開始できます

本日

PoC の内容と進め方のご確認

あわせて秘密保持契約を締結

～ 10 月 2 日

お見積りのご承認

テスト用の物件情報と予算配分の実例をご共有

10 月 5 日

PoC 開始（キックオフ）

10 月下旬に、実データで動く叩き台をご覧いただけます

株式会社クラウドネイチャー

